DIAGRAMA GANTT: "PROCESO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE ABASTECMIENTO DE AGUA PARA CUATRO CENTROS POBLADOS EN LA REGION APURÍMAC: PUMACHUCO, ERAPAMPA, CUNYACC Y CCOLLOTAYOCC"

id	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	"PROCESO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	S/. 2,497,772.10	334 días	lun 2/12/13	vie 31/10/14	
2	INICIO	S/. 0.00	0 días	lun 2/12/13	lun 2/12/13	
3	SISTEMA DE AGUA POTABLE	S/. 2,497,772.10	334 días	lun 2/12/13	vie 31/10/14	
4	CAPTACION TIPO C-1 (05 UND)	S/.10,611.54	75 días	lun 2/12/13	vie 14/02/14	
5	TRABAJOS PRELIMINARES	S/. 2,049.13	23 días	lun 2/12/13	mar 24/12/13 2	
6	MOVIMIENTO DE TIERRAS	S/. 189.53	49 días	vie 6/12/13	jue 23/01/14 5FC-19 días	
7	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	S/. 189.89	37 días	vie 13/12/13	sáb 18/01/14 6FC-42 días	
8	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	S/. 2,956.40	28 días	mié 18/12/13	mar 14/01/14 7CC+5 días	
9	REVOQUES Y ENLUCIDOS	S/. 773.47	18 días	sáb 4/01/14	mar 21/01/14 10FC-10 días	
10	INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS	S/. 1,332.50	15 días	lun 30/12/13	lun 13/01/14 8FC-16 días	
11	FILTROS	S/. 211.98	17 días	dom 12/01/14	mar 28/01/14 9FC-10 días	
12	TAPA DE INSPECCION METALICA	S/. 842.48	15 días	lun 30/12/13	lun 13/01/14 10FC-15 días	
13	PINTURA	S/. 14.85	15 días	dom 19/01/14	dom 2/02/14 11FC-10 días	
14	CERCO PERIMETRICO (10 und. - CAPTACION)	S/. 2,051.31	54 días	lun 23/12/13	vie 14/02/14 8CC+5 días	
15	CAJA DE REUNION (03 UND)	S/. 3,969.08	135 días	jue 16/01/14	vie 30/05/14	
16	TRABAJOS PRELIMINARES	S/. 1,006.05	14 días	jue 16/01/14	mié 29/01/14 14FC-30 días	
17	MOVIMIENTO DE TIERRAS	S/. 36.53	36 días	lun 20/01/14	lun 24/02/14 16FC-10 días	
18	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	S/. 688.16	21 días	vie 24/01/14	jue 13/02/14 17CC+4 días	
19	REVOQUES Y ENLUCIDOS	S/. 315.30	20 días	vie 7/02/14	dom 25/05/14 20FC-5 días	
20	INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS	S/.479.87	6 días	jue 6/02/14	mar 11/02/14 18FC-8 días	
21	TAPA DE INSPECCION METALICA	S/. 421.24	3 días	mar 11/02/14	jue 13/02/14 20FC-1 día	
22	PINTURA	S/. 5.68	6 días	vie 23/05/14	mié 28/05/14 19FC-3 días	
23	CERCO PERIMETRICO	S/-1,016.25	20 días	dom 11/05/14	vie 30/05/14 19FC-15 días	
24	LINEA SOLE CONDUCCION	S/. 1,256,150.65	200 días	mar 1/04/14	vie 17/10/14	
25	TRABAJOS PRELIMINARES	S/. 38,852.94	188 días	vie 11/04/14	mié 15/10/14 27CC+10 días	
26	MOVIMIENTO DE TIERRAS	S/. 707,790.25	176 días	dom 20/04/14	dom 12/10/14 25CC+9 días	
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS	S/. 402,955.41	200 días	mar 1/04/14	vie 17/10/14 23FC-60 días	
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS	S/. 67,345.85	195 días	mar 1/04/14	dom 12/10/14 27CC	
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS	S/. 34,400.00	150 días	dom 11/05/14	mar 7/10/14 27BC+40 días	
30	VARIOS	S/. 4,806.20	141 días	lun 26/05/14	lun 13/10/14 26CC+36 días	
31	CAMARA ROMPE PRESIÓN EN LINEA DE CONDUCCION (07 UND)	S/. 13,315.58	50 días	lun 26/05/14	lun 14/07/14	
32	TRABAJOS PRELIMINARES	S/. 66.07	9 días	lun 26/05/14	mar 3/06/14 27FC-145 días	
33	MOVIMIENTO DE TIERRAS	S/. 383.26	21 días	vie 30/05/14	jue 19/06/14 32FC-5 días	
34	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	S/. 353.36	7 días	vie 13/06/14	jue 19/06/14 33FC-7 días	
35	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	S/. 9,364.59	28 días	sáb 14/06/14	vie 11/07/14 34FC-6 días	
36	REVOQUES Y ENLUCIDOS	S/. 1,752.97	14 días	vie 27/06/14	jue 10/07/14 35FC-15 días	
37	INSTALACIONES HIDRAULICAS	S/. 1,395.33	14 días	mar 1/07/14	lun 14/07/14 36FC-10 días	
38	CAMARA DE REUNION (03 UNIDADES)	S/. 6,811.12	30 días	dom 15/06/14	lun 14/07/14	
39	TRABAJOS PRELIMINARES	S/. 28.31	4 días	dom 15/06/14	mié 18/06/14 37FC-30 días	
40	MOVIMIENTO DE TIERRAS	S/. 164.26	10 días	mar 17/06/14	jue 26/06/14 39FC-2 días	
41	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	S/. 152.72	3 días	mar 24/06/14	jue 26/06/14 40FC-3 días	
42	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	S/. 4,011.74	13 días	mié 25/06/14	lun 7/07/14 41FC-2 días	
43	REVOQUES Y ENLUCIDOS	S/. 751.27	6 días	sáb 5/07/14	jue 10/07/14 42FC-3 días	
44	INSTALACIONES HIDRAULICAS	S/. 1,702.82	5 días	jue 10/07/14	lun 14/07/14 43FC-1 día	
45	CERCO PERIMETRICO DE RESERVORIO PROYECTADO (03 RESERVORIOS)	S/. 88,214.33	60 días	sáb 5/07/14	mar 2/09/14	
46	TRABAJOS PRELIMINARES	S/. 5,393.33	20 días	sáb 5/07/14	jue 24/07/14 44FC-10 días	
47	MOVIMIENTO DE TIERRAS	S/. 2,315.58	50 días	mar 15/07/14	mar 2/09/14 46FC-10 días	
48	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	S/. 3,369.83	12 días	dom 27/07/14	jue 7/08/14 47BC+12 días	
49	CARPINTERIA METALICA	S/.71,141.40	21 días	dom 3/08/14	sáb 23/08/14 48FC-5 días	
50	PINTURA	S/. 1,906.78	9 días	mar 19/08/14	mié 27/08/14 49FC-5 días	
51	OTROS	S/. 4,087.41	20 días	sáb 9/08/14	jue 28/08/14 49FC-15 días	
52	RESERVORIO APOYADO PROYECTADO DE 80M3	S/. 65,526.50	50 días	vie 25/07/14	vie 12/09/14	
53	TRABAJOS PRELIMINARES	S/. 181.72	3 días	vie 25/07/14	dom 27/07/14 51FC-35 días	
54	MOVIMIENTO DE TIERRAS	S/. 4,715.74	47 días	lun 28/07/14	vie 12/09/14 53	
55	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	S/. 13,847.03	1 día	dom 3/08/14	dom 3/08/14 54CC+6 días	
56	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	S/. 28,869.85	27 días	lun 4/08/14	sáb 30/08/14 55	
57	TARRAJEOS Y ENLUCIDOS	S/. 5,775.24	3 días	sáb 30/08/14	lun 1/09/14 56FC-1 día	
58	PINTURA	S/. 485.43	4 días	sáb 6/09/14	mar 9/09/14 57FC +4 días	
59	VARIOS	S/. 2,678.31	24 días	vie 15/08/14	dom 7/09/14 56FC-16 días	
60	CASETA DE VALVULAS	S/. 8,973.18	25 días	sáb 9/08/14	mar 2/09/14 59CC-6 días	
61	RESERVORIO APOYADO PROYECTADO DE 45M3	S/. 45,441.32	45 días	dom 24/08/14	mar 7/10/14	
62	TRABAJOS PRELIMINARES	S/. 110.39	3 días	dom 24/08/14	mar 26/08/14 58FC-17 días	
63	MOVIMIENTO DE TIERRAS	S/. 2,864.54	42 días	mié 27/08/14	mar 7/10/14 62	
64	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	S/. 8,411.83	1 día	mar 2/09/14	mar 2/09/14 63CC+6 días	
65	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	S/. 17,956.77	27 días	mié 3/09/14	lun 29/09/14 64	
66	TARRAJEOS Y ENLUCIDOS	S/. 4,167.08	4 días	lun 29/09/14	jue 2/10/14 65FC-1 día	
67	PINTURA	S/. 381.07	2 días	vie 3/10/14	sáb 4/10/14 66	
68	VARIOS	S/. 2,576.46	21 días	dom 14/09/14	sáb 4/10/14 65FC-16 días	
69	CASETA DE VALVULAS	S/. 8,973.18	25 días	vie 12/09/14	lun 6/10/14 68CC-2 días	
70	RESERVORIO APOYADO PROYECTADO DE 25M3	S/. 31,052.06	38 días	mié 24/09/14	vie 31/10/14	
71	TRABAJOS PRELIMINARES	S/. 69.33	2 días	mié 24/09/14	jue 25/09/14 67CC-9 días	
72	MOVIMIENTO DE TIERRAS	S/. 1,799.10	30 días	vie 26/09/14	sáb 25/10/14 71	
73	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	S/. 5,282.47	1 día	mié 1/10/14	mié 1/10/14 72CC+5 días	
74	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	S/. 9,453.73	19 días	jue 2/10/14	lun 20/10/14 73	
75	TARRAJEOS Y ENLUCIDOS	S/. 1,708.82	2 días	lun 20/10/14	mar 21/10/14 74FC-1 día	
76	PINTURA	S/. 247.17	2 días	mié 22/10/14	jue 23/10/14 75	
77	VARIOS	S/. 2,518.26	18 días	mié 8/10/14	sáb 25/10/14 75FC-14 días	
78	CASETA DE VALVULAS	S/. 8,973.18	25 días	mar 7/10/14	vie 31/10/14 77CC-1 día	
79	REDES DE AGUA POTABLE	S/. 976,679.92	224 días	sáb 22/03/14	vie 31/10/14	
80	TRABAJOS PRELIMINARES	S/. 21,096.87	135 días	sáb 22/03/14	dom 3/08/14 25BC-20 días	
81	MOVIMIENTO DE TIERRAS	S/. 644,027.60	105 días	mar 8/04/14	lun 21/07/14 80BC+17 días	
82	SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS	S/. 62,072.10	10 días	jue 27/03/14	sáb 5/04/14 80CC+5 días	
83	INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS	S/. 57,138.83	94 días	mié 9/04/14	vie 11/07/14 81CC+1 día	
84	VARIOS	S/. 3,433.00	87 días	lun 28/04/14	mié 23/07/14 81FC-85 días	
85	VALVULAS	S/. 42,746.78	87 días	dom 6/04/14	mar 1/07/14 82	
86	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	S/. 146,164.74	100 días	lun 21/04/14	mar 29/07/14 83FC-82 días	
87	FIN	S/. 0.00	0 días	vie 31/10/14	vie 31/10/14 78,86;30-21	

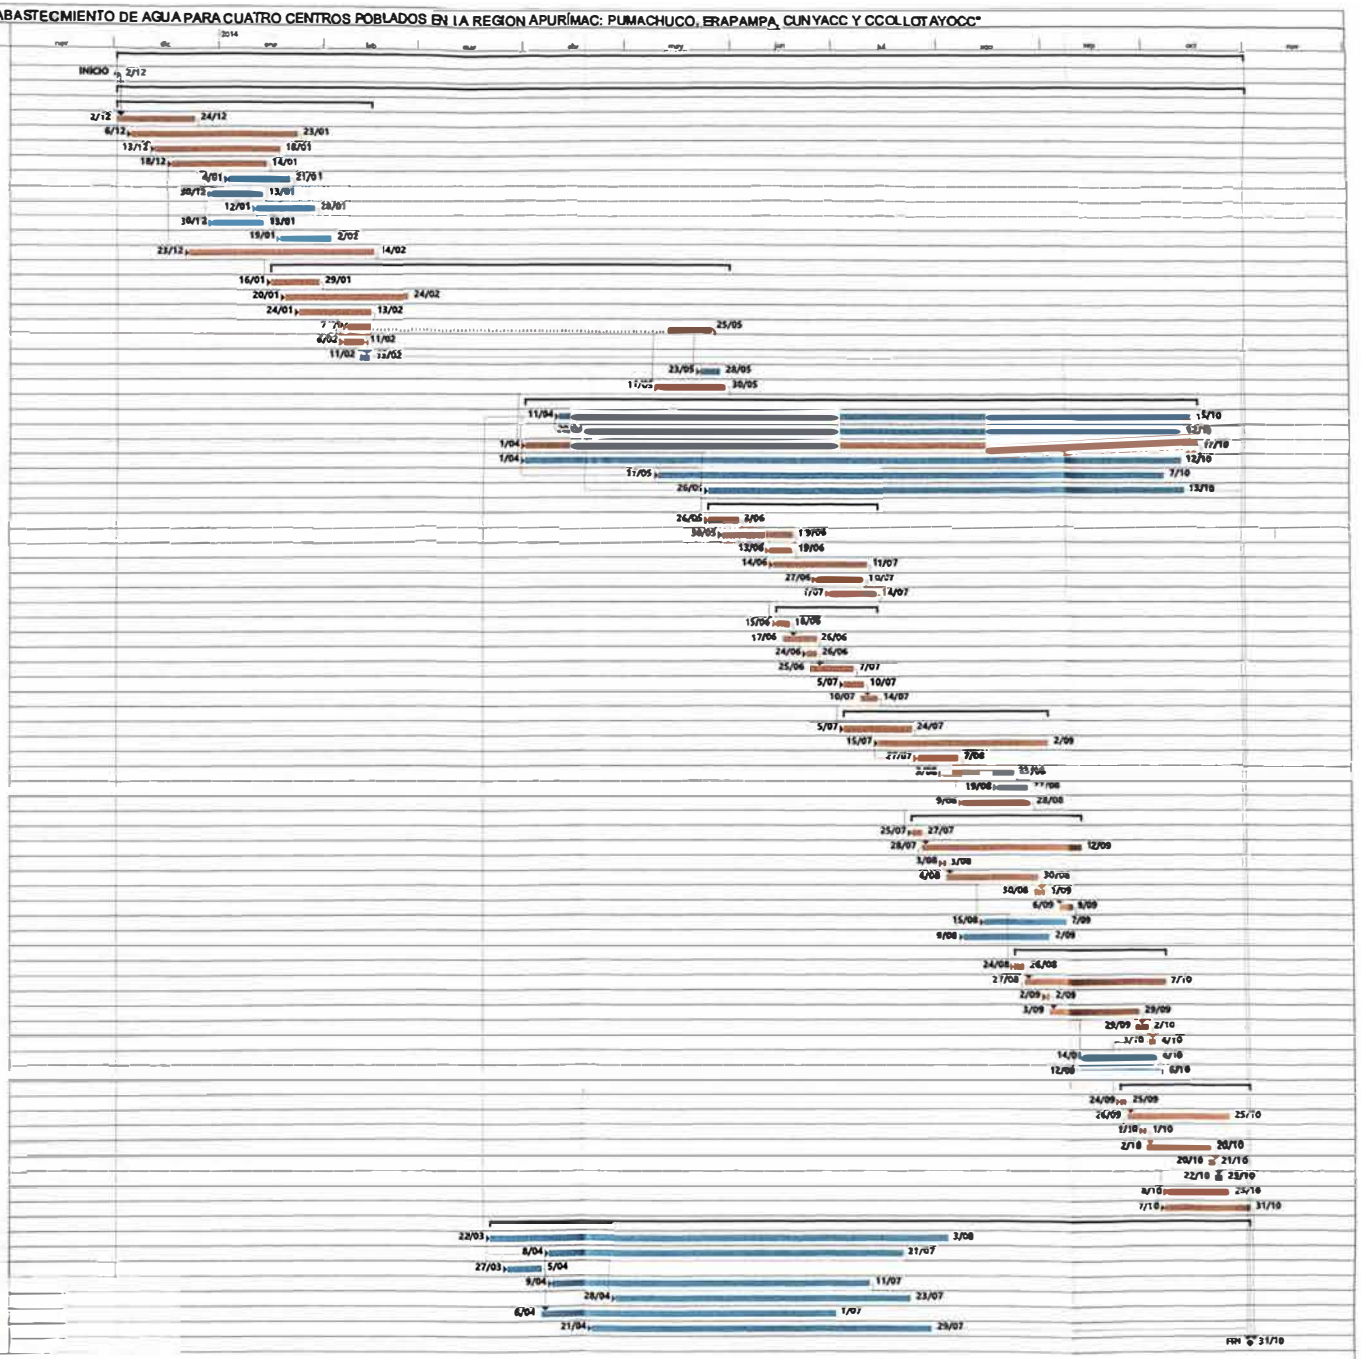

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea crítica · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · sólo el comienzo · sólo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tarea crítica · División crítica · Progreso · Progreso manual
